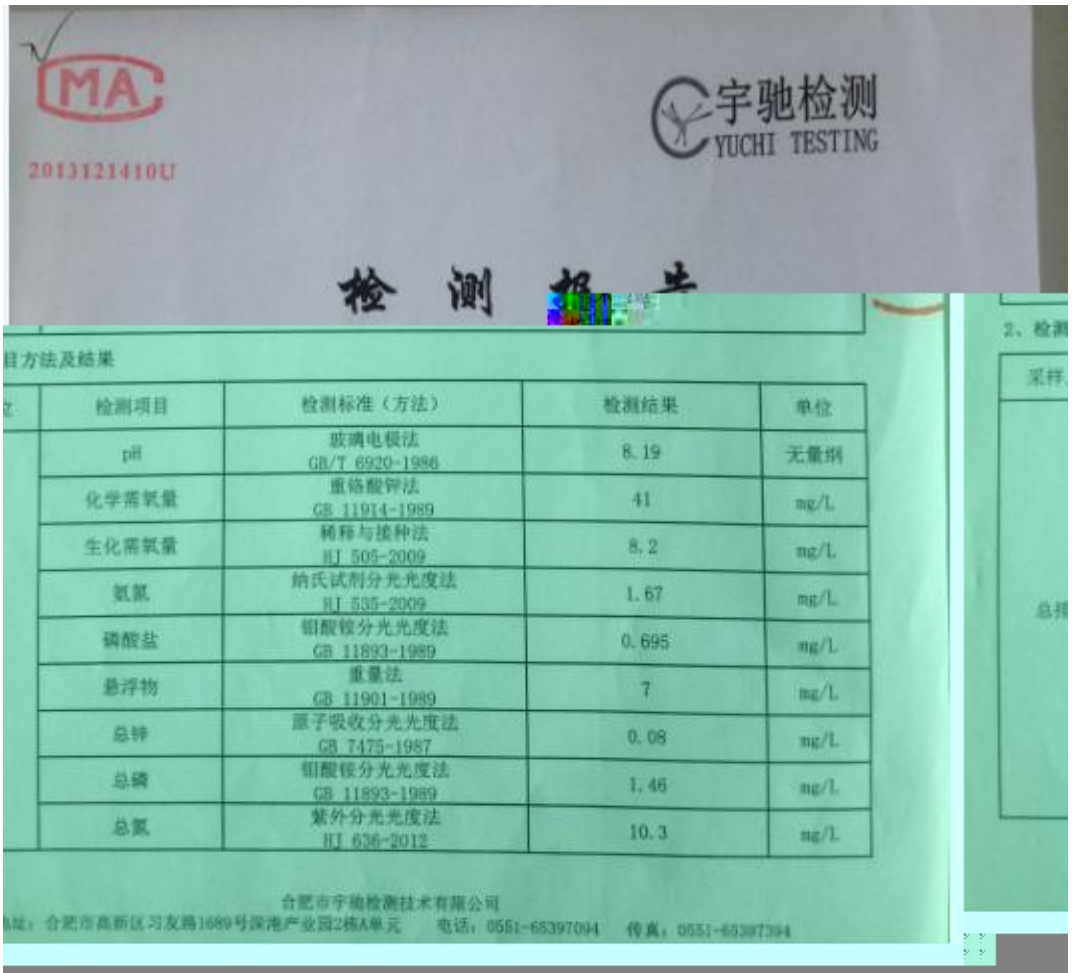

CMA
2013121410U

宇驰检测
YUCHI TESTING

检 测 报 告

目方法及结果

立	检测项目	检测标准（方法）	检测结果	单位
	pH	玻璃电极法 GB/T 6920-1986	8.19	无量纲
	化学需氧量	重铬酸钾法 GB 11914-1989	41	mg/L
	生化需氧量	稀释与接种法 HJ 505-2009	8.2	mg/L
	氨氮	纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	1.67	mg/L
	磷酸盐	钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989	0.695	mg/L
	悬浮物	重量法 GB 11901-1989	7	mg/L
	总锌	原子吸收分光光度法 GB 7475-1987	0.08	mg/L
	总磷	钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989	1.46	mg/L
	总氮	紫外分光光度法 HJ 636-2012	10.3	mg/L

合肥市宇驰检测技术有限公司

址：合肥市高新区习友路1689号深港产业园2栋A单元　　电话：0551-65397094　　传真：0551-65397394

2、检测

采样

总排

MA
3121410U

宇驰检测
YUCHI TESTING

检 测 报 告

报告编号：HFYC-BG201602-027　　报告日期:2016年03月10日

采样/接样日期：2016年2月19日

检测日期：2016年2月19日　到　2016年3月8日

（以下空白）

声明：

1. 本报告只使用于检测目的的范围。
2. 本报告仅对来样或采样分析结果负责。
3. 本报告涂改无效，报告无公司检测专用章、骑缝章无效。
4. 未经公司书面批准，不得部分复制本报告。
5. 本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下的项目测值。
6. 若对检测报告有异议，请在收到报告后五日内向检测单位提出，逾期将不受理。

合肥市宇驰检测技术有限公司
地址：合肥市高新区习友路1689号深港产业园2栋A单元　电话：0551-65397094　传真：0551-65397094

CMA
201312141OU

宇驰检测
YUCHI TESTING

检 测 报 告

报告编号：HFYC-B0201602-028　　报告日期：2016年03月21日

委 托 方：安徽江淮汽车股份有限公司

委托方地址：合肥市东流路176号

项目名称：安徽江淮汽车股份有限公司本部厂区 有组织废气

项目地址：合肥市东流路176号

编 制：

审 核：

签 发：

审核日期：2016年 3月 21日

签发日期：2016年 3月 21日

根据委托方要求进行测试，具体内容详见下页。

合肥市宇驰检测技术有限公司
地址：合肥市高新区习友路1689号深港产业园2栋A单元　电话：0551-65397094　传真：0551-65397394

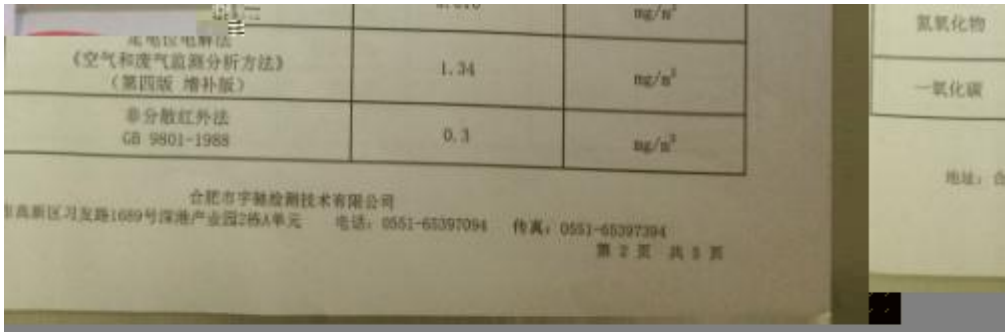

《空气和废气监测分析方法》（第四版 增补版）	1.34	mg/m³
⑧分散红外法 GB 9801-1988	0.3	mg/m³

合肥市宇赫检测技术有限公司

高新区习友路1689号深港产业园2栋A单元　电话：0551-65397094　传真：0551-65397394

第 2 页　共 3 页

氮氧化物

一氧化碳

地址：合

宇驰检测 YUCHI TESTING

检 测 报 告

报告编号：HFYC-BG201602-028　　报告日期：2016年03月21日

3、检测结果

采样日期	采样点位	排气筒高度（米）	检测项目	检测结果		
				排放浓度（mg/m³）	排风量（m³/h）	排放速率（Kg/h）
2016年2月25日	轻卡一厂涂装车间电泳烘干室废气排风筒	15	甲苯	0.098	11178	1.10×10^{-3}
			二甲苯	0.293		3.28×10^{-3}
			非甲烷总烃	1.06		1.18×10^{-2}
	轻卡一厂涂装车间面涂烘干室废气排气筒	15	甲苯	0.113	661	7.47×10^{-5}
			二甲苯	0.306		2.02×10^{-4}
			非甲烷总烃	0.85		5.62×10^{-4}
	轻卡一厂涂装车间喷漆废气排气筒	15	甲苯	0.410	53284	2.18×10^{-2}
			二甲苯	0.350		1.86×10^{-2}
			非甲烷总烃	0.89		4.74×10^{-2}
	轻卡一厂焊装车间焊接工艺废气排气筒	15	氮氧化物	50.1	619	3.10×10^{-2}
			一氧化碳	20.7		1.28×10^{-2}
			颗粒物	18.6		1.15×10^{-2}
	轻卡一厂总装车间尾气排气筒	15	非甲烷总烃	1.24	27866	3.46×10^{-2}
			氮氧化物	22.8		6.35×10^{-1}
			一氧化碳	6.2		1.73×10^{-1}
	底盘厂二车间尾气排气筒	15	非甲烷总烃	0.68	222	1.51×10^{-4}
			氮氧化物	15.0		3.33×10^{-3}
			一氧化碳	4.2		9.32×10^{-4}
	车架厂铆焊车间焊接工艺排气筒	15	氮氧化物	13.2	23199	3.06×10^{-1}
			一氧化碳	3.8		8.82×10^{-2}
			颗粒物	23.3		5.41×10^{-1}

MA

213121410U

宇驰检测
YUCHI TESTING

检 测 报 告

报告编号：HFYC-BG201602-028　　报告日期:2016年03月21日

续上表：

采样日期	采样点位	排气筒高度（米）	检测项目	检测结果		
				排放浓度（mg/m³）	排风量（m³/h）	排放速率（Kg/h）
2016年2月25日	车架厂钢焊车间电泳烘干室废气排气筒	15	甲苯	0.100	3979	3.98×10^{-3}
			二甲苯	0.313		1.25×10^{-3}
			非甲烷总烃	1.97		7.84×10^{-3}
	前桥厂前桥二车间烘干废气排气筒	15	甲苯	0.092	5644	5.19×10^{-3}
			二甲苯	0.283		1.60×10^{-3}
			非甲烷总烃	8.18		4.62×10^{-2}
	前桥厂二车间流平工艺废气排气筒	15	甲苯	0.491	2619	1.29×10^{-3}
			二甲苯	2.277		5.96×10^{-3}
			非甲烷总烃	12.35		3.23×10^{-2}
	前桥厂二车间喷漆工艺废气排气筒	15	甲苯	0.453	22334	1.01×10^{-2}
			二甲苯	0.538		1.20×10^{-2}
			非甲烷总烃	6.76		1.51×10^{-1}
	前桥厂二车间重卡线烘干废气排气筒	15	甲苯	0.190	8410	1.60×10^{-3}
			二甲苯	0.135		2.97×10^{-3}
			非甲烷总烃	4.58		3.85×10^{-2}

采样/接样日期：　2016年2月25日

检测日期：　2016年2月25日　到　2016年3月15日

（以下空白）

合肥市宇驰检测技术有限公司
地址：合肥市高新区习友路1689号深港产业园2栋A单元　电话：0551-65397094　传真：0551-65397394

CMA
213121410U

宇驰检测
YUCHI TESTING

检 测 报 告

报告编号：HFYC-BG201602-028　　报告日期:2016年03月21日

声明：

1. 本报告只使用于检测目的的范围。
2. 本报告仅对来样或采样分析结果负责。
3. 本报告涂改无效，报告无公司检测专用章、骑缝章无效。
4. 未经公司书面批准，不得部分复制本报告。
5. 本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下的项目测值。
6. 若对检测报告有异议，请在收到报告后五日内向检测单位提出，逾期将不受理。

合肥市宇驰检测技术有限公司
地址：合肥市高新区习友路1689号深港产业园2栋A单元　电话：0551-65397094　传真：0551-65397394

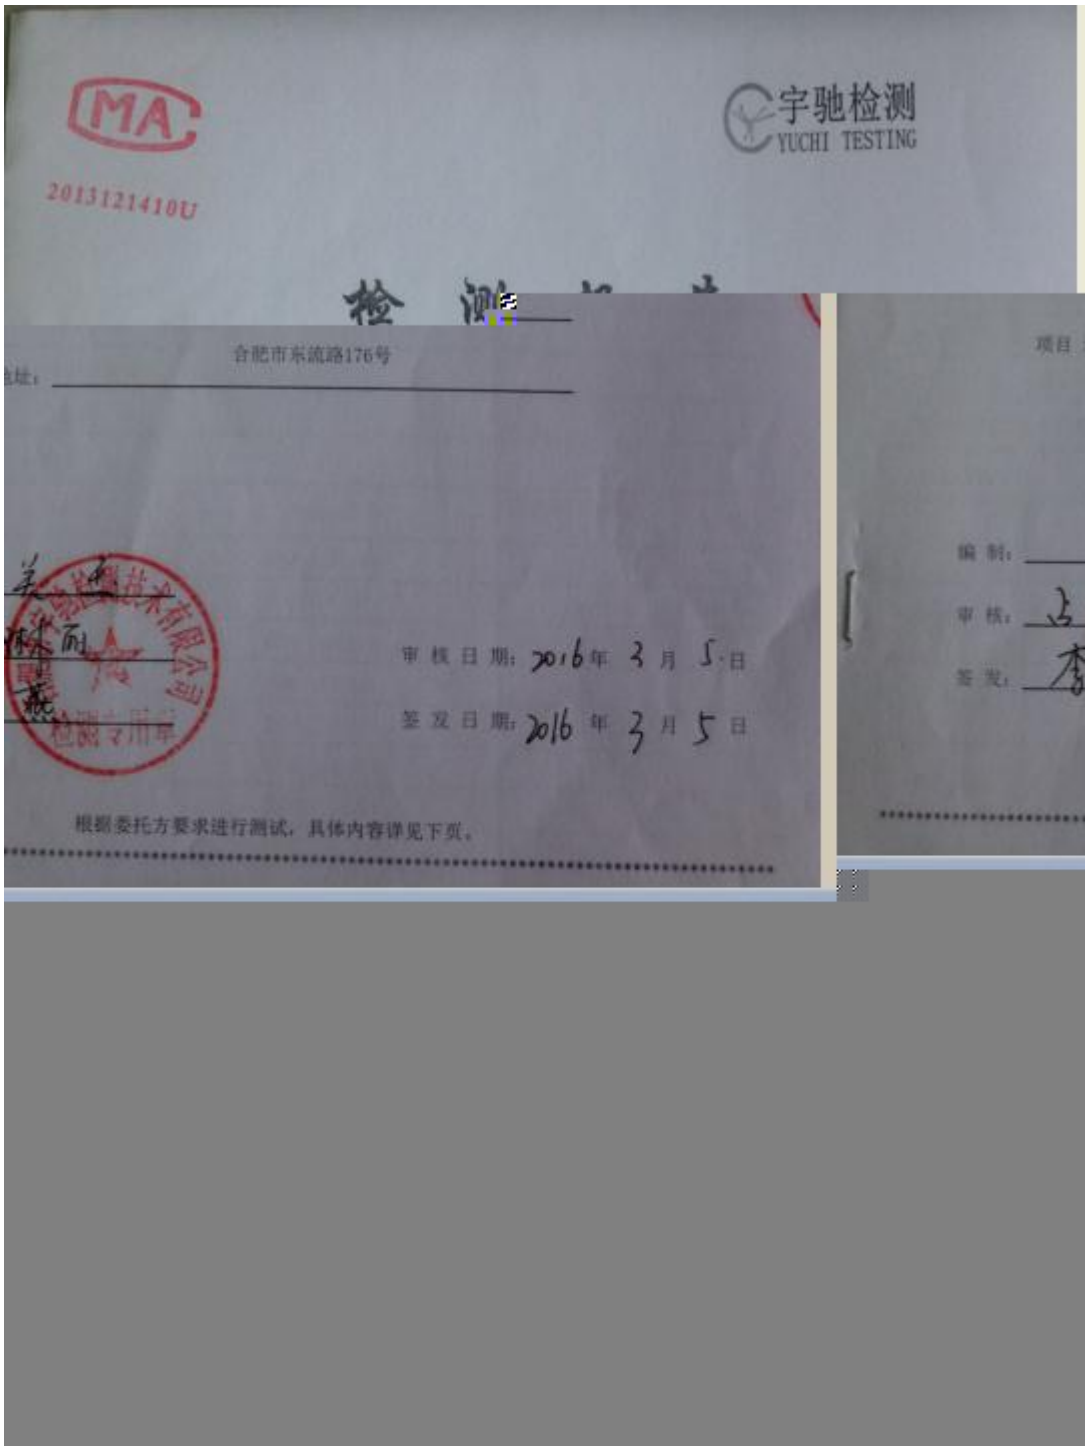
CMA
2013121410U
宇驰检测
YUCHI TESTING
合肥市东流路176号
审核日期：2016年3月5日
签发日期：2016年3月5日
根据委托方要求进行测试，具体内容详见下页。
编制：
审核：
签发：

CMA
2013121410U

宇驰检测
YUCHI TESTING

检 测 报 告

报告编号：HFYC-BG201602-026　　报告日期:2016年03月05日

一、前言

合肥市宇驰检测技术有限公司受安徽江淮汽车股份有限公司的委托，于2016年02月19日对其指定点位进行噪声检测，并提交检测报告。

二、噪声检测部分

1、检测项目信息说明

委 托 单 位	安徽江淮汽车股份有限公司		
联 系 人	王志	联 系 电 话	18956008261
样 品 类 别	厂界噪声	检 测 日 期	2016年2月19日
检 测 类 型	委托检测	采 样 人 员	张银敏、张亮
噪声仪器型号及编号：多功能声级计 AWA6228-3　HFYC-YQ-047			
风速风向仪器型号及编号：托普TPJ-30　HFYC-YQ-033			
检测方法：工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008			
气象条件：晴　风速1.9m/s　风向：北			

2、检测结果及测点分布示意图

检测点位	主要声源	测量时段	检测量结果 Leq dB(A)	备注
厂界西1#	车间、车辆	昼间（10:24）	59	——
		夜间（23:20）	48	——
厂界北2#	车间、车辆	昼间（10:29）	58	——
		夜间（23:25）	47	——
厂界东3#	车间、车辆	昼间（10:34）	59	——
		夜间（23:31）	47	——
厂界南4#	车间、车辆	昼间（10:38）	58	——
		夜间（23:39）	47	——

CMA
2013121410U

宇驰检测
YUCHI TESTING

检 测 报 告

报告编号：HFYC-BG201602-026　　报告日期:2016年03月05日

被上表：

测点分布示意图：

项目 地址：

编 制：

审 核 日 期：2016年 3月21日

签 发：　　签 发 日 期：2016年 3月 21 日

根据委托方要求进行测试，具体内容详见下页。

CMA
201312141OU

宇驰检测
YUCHI TESTING

检 测 报 告

报告编号：HFYC-BG201602-054　　报告日期:2016年03月21日

一、前言

合肥市宇驰检测技术有限公司受安徽江淮汽车股份有限公司的委托，于2016年03月01日对其指定点位进行废气采集、分析、检测，并提交检测报告。

二、废气检测部分

1、检测概况

委托单位	安徽江淮汽车股份有限公司		
联系人	王志	联系电话	18956008261
样品类型	有组织废气	样品数量	9个
检测类型	委托检测	采样人员	张亮、张敏敏
采样依据	GB/T 16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法		

2、检测项目标准（方法）说明

检测项目	检测标准（方法）	检出限	单位
颗粒物	重量法 GB/T 16157-1996	0.001	mg/m^3
非甲烷总烃	气相色谱法 HJ/T 38-1999	0.04	mg/m^3
甲苯	活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法（B） 《空气和废气监测分析方法》 （第四版 增补版）	0.010	mg/m^3
二甲苯		0.010	mg/m^3
氮氧化物	定电位电解法 《空气和废气监测分析方法》 （第四版 增补版）	1.34	mg/m^3
一氧化碳	非分散红外法 GB 9801-1988	0.3	mg/m^3

CMA
2013121410U

宇驰检测 YUCHI TESTING

检 测 报 告

报告编号：HFYC-BG201602-054　　报告日期：2016年03月21日

3、检测结果

采样日期	采样点位	排气筒高度（米）	检测项目	检测结果		
				排放浓度（ng/m^3）	排风量（m^3/h）	排放速率（Kg/h）
2016年3月1日	轻卡二厂总装车间尾气排放	15	非甲烷总烃	1.67	25761	4.30×10^{-2}
			氮氧化物	2.9		7.47×10^{-2}
			一氧化碳	0.3L		/
	轻卡二厂涂装车间喷漆废气排气筒	30	甲苯	0.624	99000	6.18×10^{-2}
			二甲苯	0.156		1.54×10^{-2}
			非甲烷总烃	1.50		1.49×10^{-1}
	轻卡二厂涂装车间电泳烘干室废气排气筒	15	甲苯	3.565	3738	1.33×10^{-2}
			二甲苯	0.953		3.56×10^{-3}
			非甲烷总烃	6.36		2.38×10^{-2}
	轻卡二厂涂装车间面涂烘干室排气筒	20	甲苯	0.676	949	6.42×10^{-4}
			二甲苯	0.386		3.66×10^{-4}
			非甲烷总烃	1.67		1.58×10^{-3}
	轻卡二厂涂装车间喷漆废气排气筒	15	甲苯	0.639	99000	6.33×10^{-2}
			二甲苯	0.157		1.55×10^{-2}
			颗粒物	9.63		9.53×10^{-1}
	轻卡三厂电泳烘干室废气	15	甲苯	0.327	3355	1.10×10^{-3}
			二甲苯	0.305		1.02×10^{-3}
			非甲烷总烃	5.64		1.89×10^{-2}
	轻卡三厂涂装车间面涂烘干室排气筒	15	甲苯	0.238	5054	1.20×10^{-3}
			二甲苯	0.276		1.39×10^{-3}
			非甲烷总烃	3.54		1.79×10^{-2}

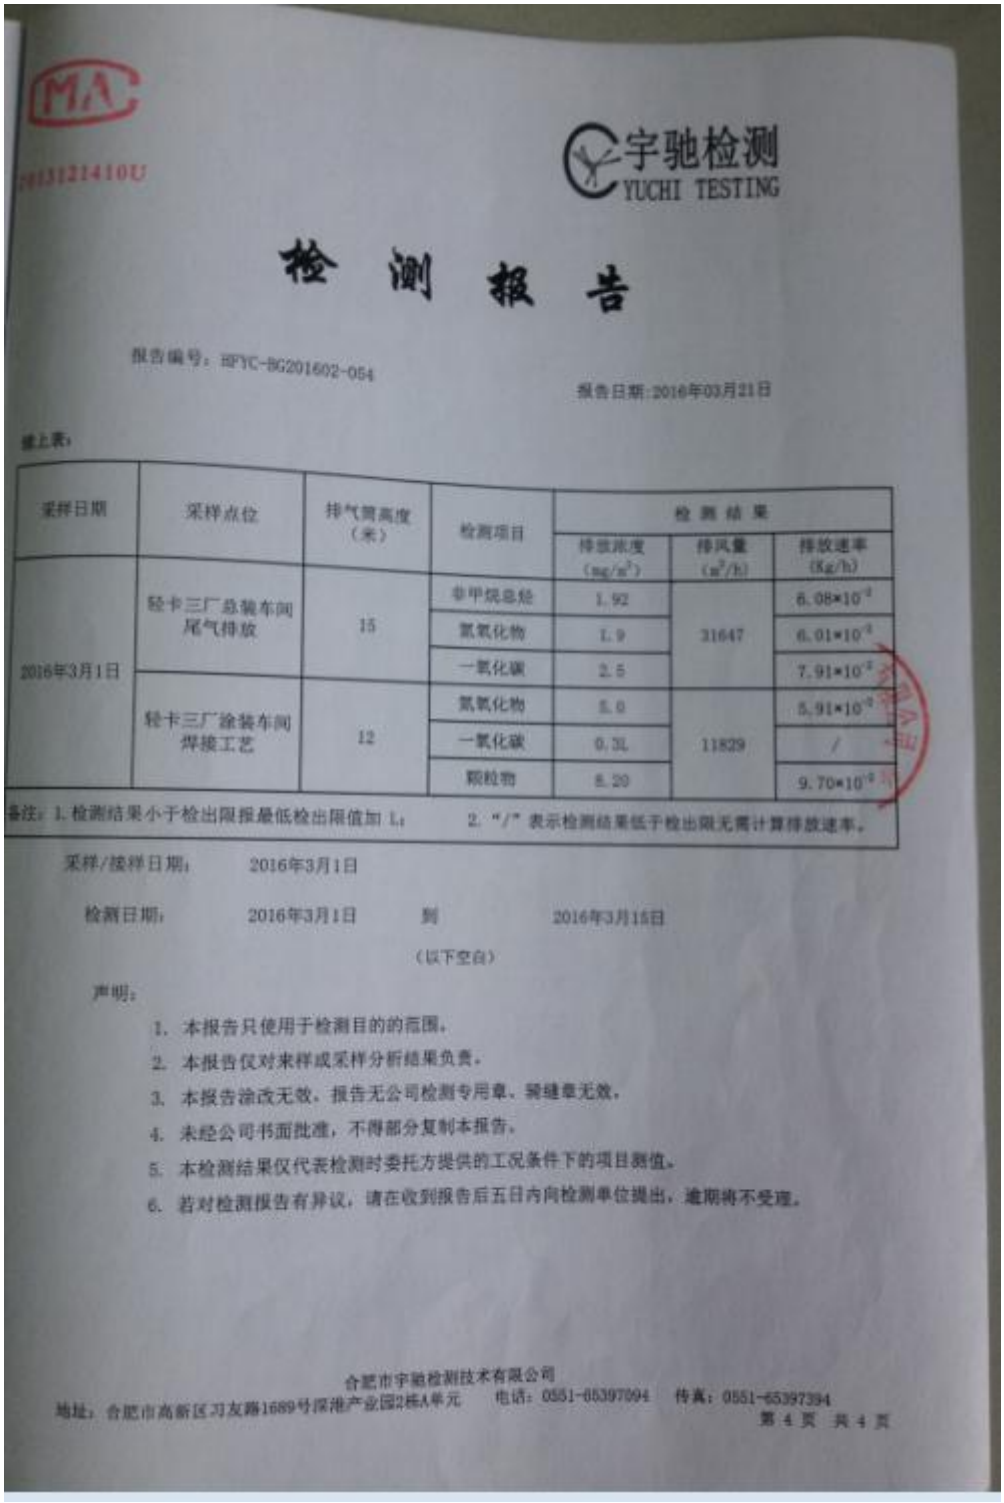

CMA
201321410U

宇驰检测
YUCHI TESTING

检 测 报 告

报告编号：HFYC-BG201602-054

报告日期：2016年03月21日

续上表：

采样日期	采样点位	排气筒高度（米）	检测项目	检测结果		
				排放浓度（mg/m³）	排风量（m³/h）	排放速率（Kg/h）
2016年3月1日	轻卡三厂总装车间尾气排放	15	非甲烷总烃	1.92	31647	6.08×10^{-2}
			氮氧化物	1.9		6.01×10^{-2}
			一氧化碳	2.5		7.91×10^{-2}
	轻卡三厂涂装车间焊接工艺	12	氮氧化物	5.0	11829	5.91×10^{-2}
			一氧化碳	0.3L		/
			颗粒物	8.20		9.70×10^{-2}

备注：1.检测结果小于检出限报最低检出限值加 L；　2."/"表示检测结果低于检出限无需计算排放速率。

采样/送样日期：　2016年3月1日

检测日期：　2016年3月1日　到　2016年3月15日

（以下空白）

声明：

1. 本报告只使用于检测目的的范围。
2. 本报告仅对来样或采样分析结果负责。
3. 本报告涂改无效，报告无公司检测专用章、骑缝章无效。
4. 未经公司书面批准，不得部分复制本报告。
5. 本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下的项目测值。
6. 若对检测报告有异议，请在收到报告后五日内向检测单位提出，逾期将不受理。

合肥市宇驰检测技术有限公司
地址：合肥市高新区习友路1689号深港产业园2栋A单元　电话：0551-65397094　传真：0551-65397394

CMA
2013121410U

宇驰检测
YUCHI TESTING

检 测 报 告

报告编号：HFYC-BG201602-068　　报告日期：2016年03月05日

委 托 方：安徽江淮汽车股份有限公司

委托方地址：合肥市东流路176号

项目名称：安徽江淮汽车股份有限公司桃花厂区 噪声

项目地址：合肥市升霞路282号

编 制：

审 核：　　审核日期：2016年3月5日

签 发：　　签发日期：2016年3月5日

根据委托方要求进行测试，具体内容详见下页。

合肥市宇驰检测技术有限公司
地址：合肥市高新区习友路1689号深港产业园2栋A单元　电话：0551-65397094　传真：0551-65397394

CMA

宇驰检测 YUCHI TESTING

2013121410U

检 测 报 告

报告编号：HFYC-BG201602-068　　报告日期:2016年03月05日

一、前言

合肥市宇驰检测技术有限公司受安徽江淮汽车股份有限公司的委托，于2016年02月19日对安徽江淮汽车股份有限公司桃花厂区指定点位进行噪声检测，并提交检测报告。

二、噪声检测部分

1、检测项目信息说明

委托单位	安徽江淮汽车股份有限公司		
联系人	王志	联系电话	18956008261
样品类别	厂界噪声	检测日期	2016年2月19日
检测类型	委托检测	采样人员	高德翔、张敏敏
噪声仪器型号及编号：多功能声级计 AWA6228-3　HFYC-YQ-047			
风速风向仪器型号及编号：托普TPJ-30　HFYC-YQ-033			
检测方法：工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008			
气象条件：晴　风速1.9m/s　风向：北			

2、检测结果及测点分布示意图

检测点位	主要声源	测量时段	检测量结果 Leq dB(A)	备注
南厂界1#	车间、车辆	昼间（09:48）	59	——
		夜间（22:43）	48	——
西厂界2#	车间、车辆	昼间（09:50）	56	——
		夜间（22:50）	48	——
北厂界3#	车间、车辆	昼间（09:55）	59	——
		夜间（22:55）	47	——
东边界4#	车间	昼间（10:03）	56	——
		夜间（22:59）	47	——

CMA

2013121410U

宇驰检测 YUCHI TESTING

检 测 报 告

报告编号：HFYC-BG201602-068　　报告日期:2016年03月05日

续上表：

测点分布示意图：

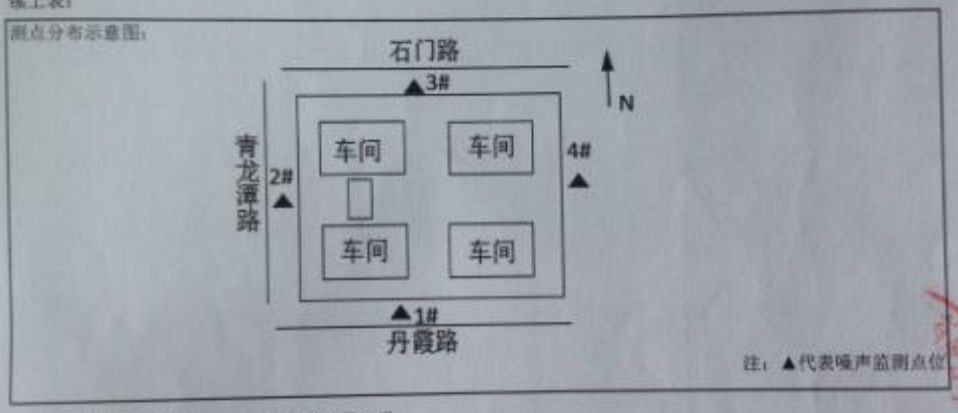

采样/提样日期：2016年2月19日

检测日期：2016年2月19日　到　2016年2月19日

（以下空白）

声明：

1. 本报告只使用于检测目的的范围。
2. 本报告仅对来样或采样分析结果负责。
3. 本报告涂改无效，报告无公司检测专用章、骑缝章无效。
4. 未经公司书面批准，不得部分复制本报告。
5. 本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下的项目测值。
6. 若对检测报告有异议，请在收到报告后五日内向检测单位提出，逾期将不受理。

合肥市宇驰检测技术有限公司
电话：0551-65397094　传真：0551-65397094
